

Compte rendu E5

Création, mise en ligne et maintenance du site web de l'entreprise

Début du projet : 25 juin 2025 | Maintenance reprise pendant le second stage : janvier à février 2026

Type de projet	Modernisation du site web et simplification de sa maintenance
Solution retenue	Squarespace, outil low-code/no-code par abonnement
Période de création	Du 25 juin 2025 à la fin du premier stage, environ août 2025
Période de maintenance	Reprise pendant le second stage, de janvier à février 2026
Compétences principales	Développer la présence en ligne de l'organisation ; répondre aux incidents, demandes d'assistance et d'évolution

1. Contexte

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé à la modernisation du site web de l'entreprise. L'entreprise disposait déjà d'un site internet, mais celui-ci était ancien visuellement et entièrement réalisé en HTML et CSS.

Cette situation posait une difficulté importante : les propriétaires ne disposaient pas de compétences en développement web. Modifier une page, ajouter un prix, changer une information ou corriger un contenu nécessitait donc soit des connaissances techniques, soit l'intervention d'une personne extérieure.

Le projet a commencé le 25 juin 2025, pendant mon premier stage. La création et la mise en service du nouveau site ont été réalisées pendant cette première période de stage. Il y a ensuite eu une interruption liée à mon absence de l'entreprise entre la fin du premier stage, vers août 2025, et le début du second stage en janvier 2026. La maintenance et les évolutions du site ont ensuite repris pendant le second stage, jusqu'au début du mois de février 2026.

2. Problématique

L'ancien site répondait partiellement au besoin de présence en ligne, mais il n'était plus adapté au fonctionnement de l'entreprise. Sa maintenance était trop technique pour une très petite structure ne disposant pas de développeur interne.

Faire appel à un développeur ou à un freelance pour chaque modification aurait représenté un coût trop important. L'entreprise souhaitait donc une solution plus simple, permettant aux propriétaires de modifier eux-mêmes les contenus, les tarifs, les informations pratiques ou les pages du site.

3. Objectifs du projet

- moderniser l'image du site web de l'entreprise ;
- remplacer une solution HTML/CSS difficile à maintenir par un outil plus accessible ;
- présenter les gîtes et leurs tarifs de manière claire ;
- mettre en place un formulaire de réservation facilement accessible ;
- transmettre les demandes de réservation directement par e-mail aux propriétaires ;
- proposer le contenu du site en français et en anglais ;
- ajouter les informations pratiques : commerces locaux, services utiles et moyens de transport ;

- intégrer les pages légales nécessaires ;
- permettre aux propriétaires de maintenir le site sans dépendre d'un développeur externe.

4. Analyse du besoin et choix de la solution

L'analyse du besoin a mis en évidence plusieurs contraintes : le budget limité, l'absence de compétences internes en développement web, la nécessité de présenter clairement les hébergements et le besoin de pouvoir modifier le site rapidement.

Plusieurs possibilités pouvaient être envisagées : conserver le site HTML/CSS existant, utiliser un CMS classique ou choisir une solution low-code/no-code par abonnement. Au regard du budget et du niveau d'autonomie souhaité par les propriétaires, la solution retenue a été Squarespace.

Squarespace permet de créer et de maintenir un site à partir d'une interface graphique. Cette solution permet de modifier les pages, les textes, les images, les liens et certains paramètres sans écrire directement du code. Elle correspondait donc au besoin de l'entreprise : disposer d'un site plus moderne, plus simple à administrer et moins dépendant d'un développeur externe.

5. Réalisation du site

Le site a été structuré autour des besoins principaux des visiteurs et des propriétaires. L'objectif était de rendre les informations importantes facilement accessibles et de simplifier la prise de contact pour les réservations.

Élément mis en place	Objectif
Page d'accueil	Présenter l'entreprise, l'activité et les hébergements.
Pages dédiées aux gîtes	Détailler chaque hébergement, ses caractéristiques et ses tarifs selon les périodes de l'année.
Formulaire de réservation	Permettre aux visiteurs de faire une demande facilement, transmise directement par e-mail aux propriétaires.
Informations pratiques	Ajouter des liens vers les commerces locaux, les services utiles et les moyens de transport.
Version française et anglaise	Rendre le site accessible à une clientèle française et internationale.
Pages légales	Ajouter les mentions légales et les informations obligatoires.

Captures associées à la réalisation du site

Les captures ci-dessous illustrent la structure du site, les pages créées et les contenus ajoutés dans Squarespace.

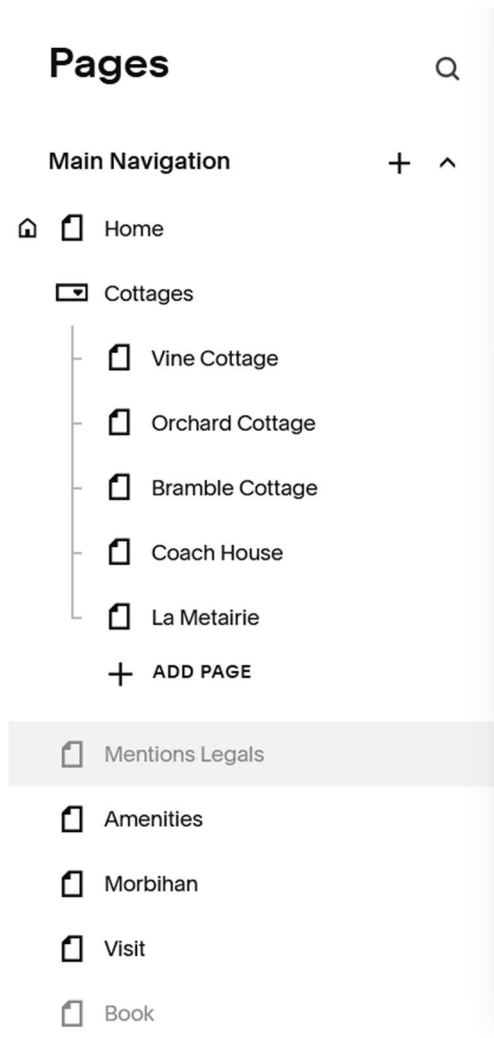


Figure 2 - Interface Squarespace : organisation des pages du site et pages principales.




Figure 3 - Navigation principale du site public.

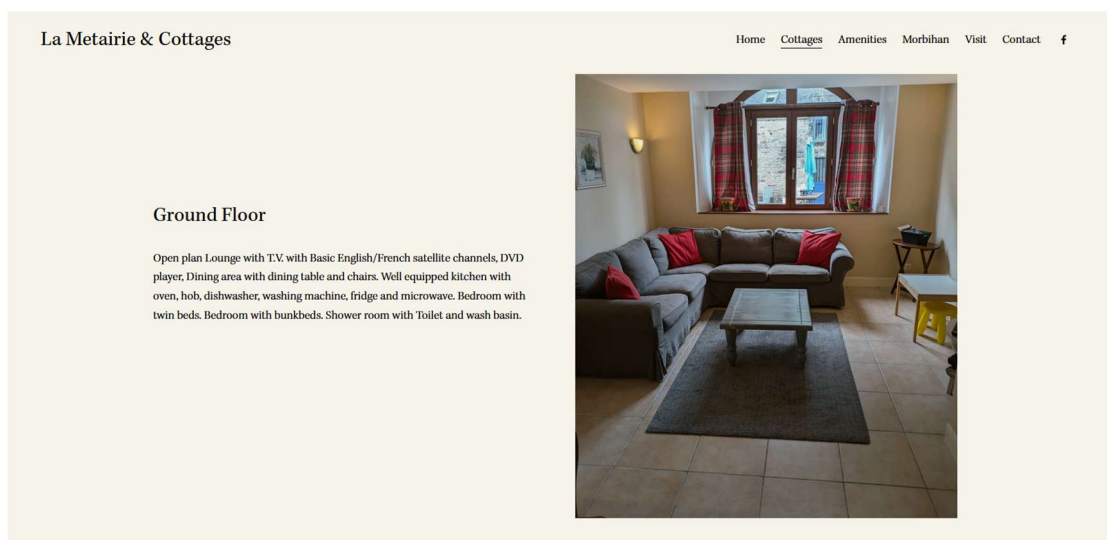


Figure 4 - Exemple d'une page de gîte avec description et photographie.

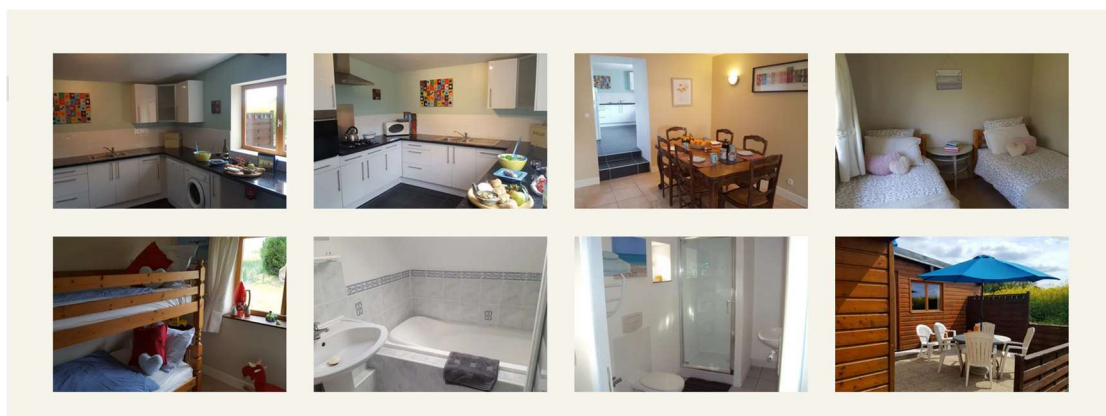


Figure 5 - Galerie photos intégrée à une page de gîte.

Early Spring	Easter	Spring	Early Summer
21st Feb to 27th March 2026	28th of March to 17th April 2026	18th April to 22nd May 2026	23rd May to 19th June 2026
Changeover day: flexible Minimum stay 2 nights Weekly Rate: £645/762 € Nightly Rate: £200/230 €	Changeover day: Flexible Minimum stay 7 nights Weekly Rate: £825/974€	Changeover day: Flexible Minimum stay 3 nights Weekly Rate: £695/821 € Nightly Rate: £200/230 €	Changeover day: Flexible Minimum Stay 7 nights Weekly Rate: £850/1003 €
UPGRADE ⓘ			EDIT SECTION 📄 ❤️ ⬆️ ⬇️ REMOVE
Summer	Peak Season	Late Summer/Autumn	Write here...
20th June to 10th July 2026	11th July to 4th of September 2026	5th of September to 27th November 2026	
Changeover day: Saturday Minimum Stay 7 nights Weekly Rate: £1125/1328 €	Changeover day: Saturday Minimum Stay 7 nights Weekly Rate: £1400 /1652 €	Changeover day: Flexible Minimum Stay 3 nights Weekly Rate £775/915€ Nightly Rate: £200/230 €	Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

Figure 6 - Exemple de section présentant les tarifs selon les périodes de l'année.

A few of our favourite places to visit

Beaches:

- Men Du - great for little ones
- Erdeven
- Quiberon - great for body boarding
- Carnac Plage
- Guidel Plage

Days out with kids

- [Le Petit Delire - Bouncy castle park](#)
- [Zoo Pont Scorff](#)
- [Branféré](#)
- [Parc De Préhistoire De Bretagne](#)
- [West wake park - water park](#)
- [Kingoland](#)
- [Forest Adrenaline Carnac](#)

Places of Interest:

- Auray
- St Goustan (Port of Auray)
- Rochefort en Terre
- Vannes
- Île-aux-Moines
- St Anne D' Auray
- [Museum of Breton Resistance](#)
- [Chateau de Josselin](#)
- [Interceltique Festival - Lorient](#)

Markets

- Auray - Monday
- Carnac - Wednesday and Sunday
- Vannes - Tuesday and Friday

For more ideas, visit morbihan.com

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Figure 8 - Page enrichie avec liens vers plages, lieux d'intérêt, sorties et marchés locaux.

6. Mise à disposition du service

Le service mis à disposition est un site web vitrine fonctionnel, accessible aux visiteurs et administrable par les propriétaires. Il permet de présenter les hébergements, d'afficher les tarifs, de donner des informations pratiques et de faciliter les demandes de réservation.

La mise en place du formulaire de réservation est un point important du projet. Les demandes sont envoyées directement par e-mail aux propriétaires, ce qui permet de centraliser les contacts sans mettre en place un système plus complexe.

Captures associées à la mise à disposition du service

Ces captures montrent le formulaire mis à disposition des visiteurs pour simplifier les demandes de réservation.

Name

First Name (required)

Last Name (required)

Email (required)

Subject (required)

Message (required)

Cottage of Interest

Select an option

Submit

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Figure 9 - Exemple de formulaire de contact avec sélection du gîte concerné.

Book a Cottage

If your dates are at all flexible, please let us know. We book up quickly, especially during peak season, but would love to find a way to host you.

Name

First Name (required)

Last Name (required)

Email (required)

Select Cottage

Phone (required)

Country

Number

Date of Arrival (required)

Date of Departure (required)

Number of Adults (required)

Number of Kids (required)

Submit

Figure 10 - Formulaire de réservation détaillé : dates, gîte, téléphone et nombre de personnes.

7. Maintenance, assistance et demandes d'évolution

Après la phase initiale de création, la maintenance du site a principalement consisté à répondre aux demandes de correction ou d'évolution transmises par les propriétaires. La maintenance active a repris pendant le second stage, en janvier 2026, après une période sans présence en entreprise entre août 2025 et janvier 2026.

L'entreprise étant une très petite structure, elle ne disposait pas d'outil de ticketing. Les signalements ou demandes étaient généralement transmis par e-mail ou oralement. Cette organisation était adaptée à la taille de l'entreprise, même si elle reste moins formalisée qu'un système de tickets.

La capture suivante illustre un exemple de demande reçue par e-mail avant le second stage. Elle montre que les besoins concernaient à la fois la mise en place d'une solution de stockage sécurisée et les ajustements du site web déjà créé.

Hi Liam

We're very happy to have you back for your second period of stages. To properly prepare for your arrival next week I'm going to fill you in on the main things that need doing.

Like we talked about over the summer, we definitely need to get a way to securely store our documents and I think that project will fit nicely into what you need to do for your exams. We have some things here that you may need to go through but we're ready to buy whatever is needed within a budget we can figure out in person.

As for that website you set up for us, some extra adjustments need to be made. I went in and tried to do some things myself but I'm not totally comfortable with it yet. Having you here will help get them sorted quicker.

See you next week!

Joanne



Figure - Exemple d'e-mail de demande reçu avant le second stage

- correction d'erreurs de contenu ou d'affichage ;
- mise à jour de textes, tarifs ou informations pratiques ;
- vérification du formulaire de réservation ;
- ajustement de pages selon les retours des propriétaires ;
- vérification des liens vers les services locaux et moyens de transport ;
- contrôle de cohérence entre les versions française et anglaise.

8. Diagramme de Gantt

Le diagramme ci-dessous distingue les deux périodes de stage. La première période correspond à la création et à la mise en service du site. La seconde période correspond à la reprise de la maintenance et aux demandes d'évolution. La pause entre août 2025 et janvier 2026 est volontairement indiquée afin de montrer qu'il n'y a pas eu de présence en entreprise pendant cette période.

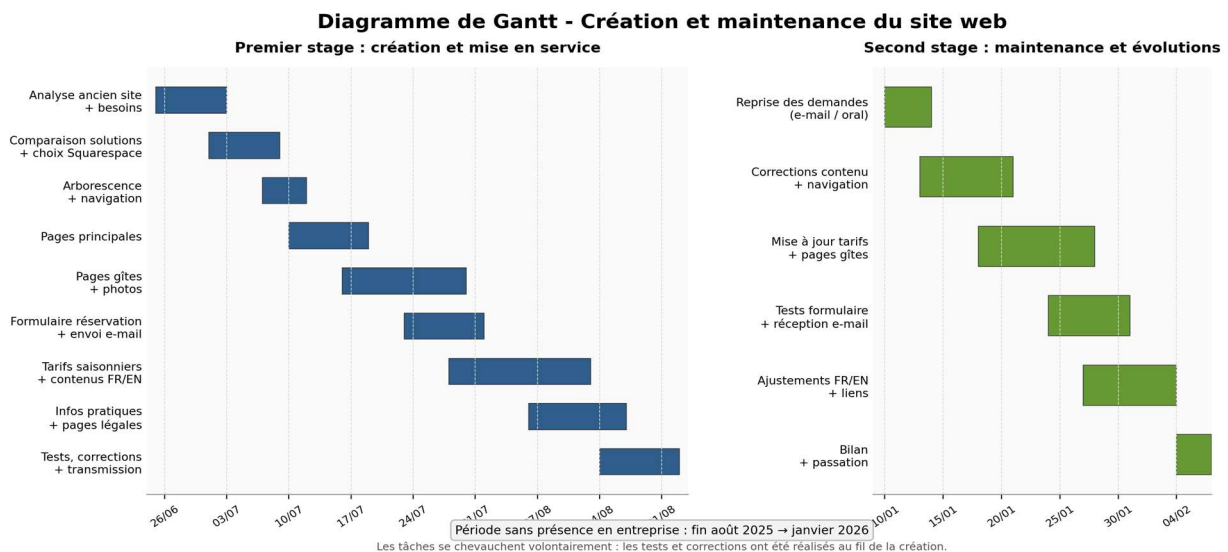


Figure 1 - Diagramme de Gantt avec séparation des deux périodes de stage et chevauchement réaliste des tâches

Tableau récapitulatif du planning :

Période	Étape	Travail réalisé
25/06/2025 - 02/07/2025	Analyse de l'ancien site et des besoins	Prise de connaissance de l'ancien site HTML/CSS, identification des limites, des contraintes de budget et du besoin d'autonomie des propriétaires.
01/07/2025 - 08/07/2025	Comparaison des solutions	Étude des possibilités : conservation du site existant, recours à un développeur, CMS ou solution low-code/no-code. Choix de Squarespace.
07/07/2025 - 11/07/2025	Arborescence et navigation	Définition de la structure du site : accueil, pages gîtes, informations pratiques, contact, réservation et mentions légales.
10/07/2025 - 18/07/2025	Création des pages principales	Création et mise en forme des premières pages du site à partir de l'interface Squarespace.
16/07/2025 - 29/07/2025	Pages des gîtes et photos	Création des pages dédiées aux hébergements, ajout des descriptions, photos et informations propres à chaque gîte.
23/07/2025 - 31/07/2025	Formulaire de réservation	Mise en place du formulaire de réservation et configuration de l'envoi des demandes par e-mail aux propriétaires.
28/07/2025 - 12/08/2025	Tarifs et contenus français/anglais	Ajout des tarifs saisonniers et adaptation progressive des contenus pour les versions française et anglaise.
06/08/2025 - 16/08/2025	Informations pratiques et pages légales	Ajout des liens locaux, informations de transport, pages utiles aux visiteurs et mentions légales.
14/08/2025 - 22/08/2025	Tests, corrections et transmission	Tests de navigation, vérification du formulaire, corrections de contenu et explications données aux propriétaires.
Fin août 2025 - 09/01/2026	Pause entre les deux stages	Période sans présence en entreprise. Aucune intervention régulière réalisée pendant cette période.
10/01/2026 - 13/01/2026	Reprise des demandes	Analyse des demandes reçues avant le second stage, principalement

13/01/2026 - 27/01/2026	Corrections et évolutions	transmises par e-mail ou oralement. Corrections de contenu, ajustements de navigation, mise à jour de certaines pages et des informations demandées.
24/01/2026 - 03/02/2026	Vérifications	Tests du formulaire, vérification de la réception par e-mail, contrôle des liens, des pages FR/EN et des informations importantes.
04/02/2026 - 06/02/2026	Bilan et passation	Dernières corrections, bilan du travail effectué et rappel aux propriétaires du fonctionnement de Squarespace.

9. Tests et vérifications

Plusieurs vérifications ont été réalisées afin de s'assurer que le site répondait correctement aux besoins de l'entreprise et des visiteurs.

- accès aux différentes pages du site ;
- affichage correct des pages de présentation des gîtes ;
- lisibilité des tarifs selon les périodes de l'année ;
- fonctionnement du formulaire de réservation ;
- réception des demandes par e-mail ;
- présence des informations en français et en anglais ;
- fonctionnement des liens vers les services locaux et moyens de transport ;
- présence des pages légales nécessaires ;
- facilité de modification du contenu depuis l'interface Squarespace.

Capture associée aux tests du formulaire

La capture suivante illustre la réception d'une demande envoyée depuis le formulaire, ce qui valide le fonctionnement du circuit visiteur -> formulaire -> e-mail des propriétaires.

Sent via form submission from [La Metairie & Cottages](#)

Name: Alan Clouder

Email: [REDACTED]

Select Cottage: --

Phone: +44 [REDACTED]

Date of Arrival: 14 June 2026

Date of Departure: 21 June 2026

Number of Adults: 2

Number of Kids: 1

[Create Invoice](#)

[Manage Submissions](#)

Does this submission look like spam? [Report it here.](#)

Figure 11 - Exemple de demande reçue par e-mail après envoi du formulaire de réservation.

10. Compétences mobilisées

Compétence	Justification dans la situation
Développer la présence en ligne de l'organisation	Compétence principale. Le projet a modernisé le site web de l'entreprise, amélioré la présentation des gîtes, ajouté des contenus en français et en anglais, un formulaire de réservation, des informations pratiques, des liens utiles et des pages légales.
Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution	Compétence principale. La phase de maintenance a consisté à traiter les demandes des propriétaires : corrections, mises à jour, ajustements de contenu, vérification du formulaire et évolution des pages. Les demandes étaient transmises par e-mail ou oralement.
Travailler en mode projet	Le travail a suivi plusieurs étapes : analyse du besoin, étude des solutions, choix de l'outil, création du site, tests, mise à disposition, puis maintenance pendant le second stage.
Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Le service livré est un site web vitrine accessible aux visiteurs et administrable par les propriétaires. Il facilite la présentation des hébergements et la réception des demandes de réservation.
Gérer le patrimoine informatique	Compétence secondaire. Le site web existant faisait partie du patrimoine numérique de l'entreprise. Le projet a consisté à remplacer une solution difficile à maintenir par un service plus adapté et plus pérenne.

11. Bilan

Ce projet a permis de moderniser la présence en ligne de l'entreprise tout en répondant à une contrainte importante : la simplicité de maintenance. Le passage d'un site HTML/CSS vers Squarespace permet aux propriétaires de modifier le contenu sans dépendre systématiquement d'un développeur.

La solution mise en place répond aux besoins de l'entreprise : présenter les hébergements, faciliter les demandes de réservation, proposer le site en français et en anglais, fournir des informations pratiques et intégrer les pages légales nécessaires.

La maintenance réalisée pendant le second stage a également permis de traiter les demandes d'assistance et d'évolution dans un contexte adapté à une très petite structure, où les signalements étaient principalement faits par e-mail ou oralement.

